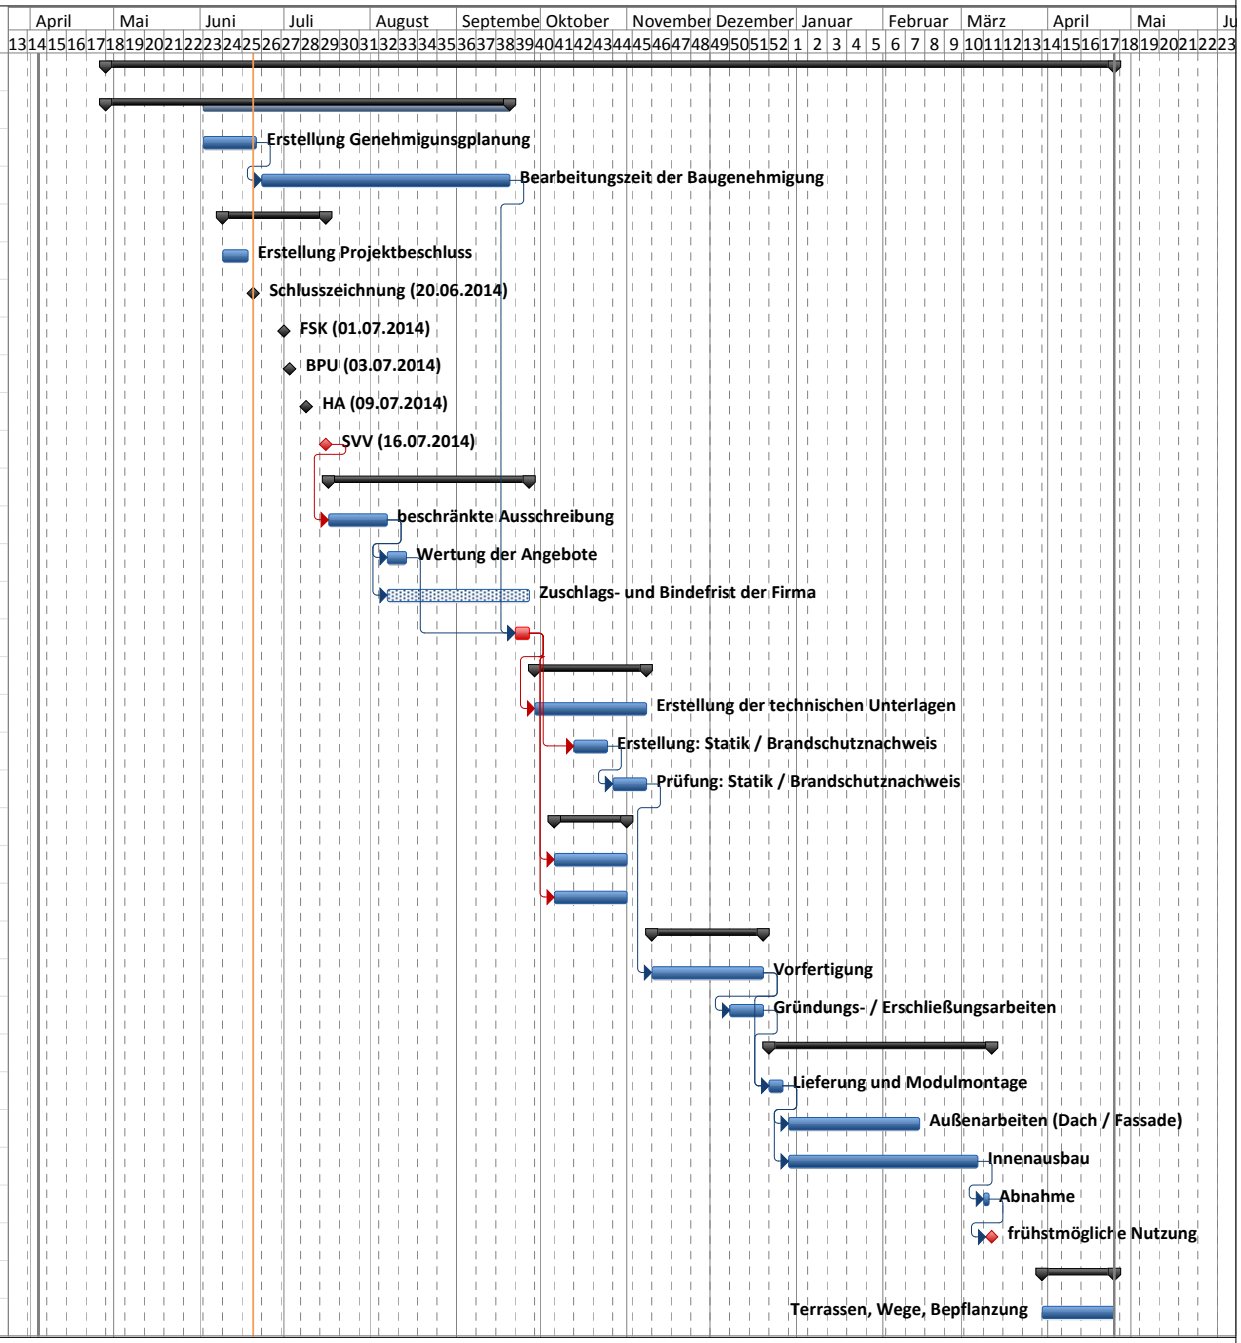Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Erweiterung Kita PA**	**260 Tage**	**Mo 28.04.14**	**Fr 24.04.15**
2	**Genehmigungsplanung**	**105 Tage**	**Mo 28.04.14**	**Fr 19.09.14**
3	Erstellung Genehmigungsplanung	15 Tage	Mo 02.06.14	Fr 20.06.14
4	Bearbeitungszeit der Baugenehmigung	65 Tage	Mo 23.06.14	Fr 19.09.14
5	**Projektbeschluss**	**27 Tage**	**Mo 09.06.14**	**Mi 16.07.14**
6	Erstellung Projektbeschluss	7 Tage	Mo 09.06.14	Di 17.06.14
7	Schlusszeichnung (20.06.2014)	0 Tage	Fr 20.06.14	Fr 20.06.14
8	FSK (01.07.2014)	0 Tage	Di 01.07.14	Di 01.07.14
9	BPU (03.07.2014)	0 Tage	Do 03.07.14	Do 03.07.14
10	HA (09.07.2014)	0 Tage	Mi 09.07.14	Mi 09.07.14
11	SVV (16.07.2014)	0 Tage	Mi 16.07.14	Mi 16.07.14
12	**Ausschreibung / Vergabe**	**52 Tage**	**Do 17.07.14**	**Fr 26.09.14**
13	beschränkte Ausschreibung	15 Tage	Do 17.07.14	Mi 06.08.14
14	Wertung der Angebote	5 Tage	Do 07.08.14	Mi 13.08.14
15	Zuschlags- und Bindefrist der Firma	37 Tage	Do 07.08.14	Fr 26.09.14
16	Auftragsvergabe	5 Tage	Mo 22.09.14	Fr 26.09.14
17	**Technische Bearbeitung**	**30 Tage**	**Mo 29.09.14**	**Fr 07.11.14**
18	Erstellung der technischen Unterlagen	30 Tage	Mo 29.09.14	Fr 07.11.14
19	Erstellung: Statik / Brandschutznachweis	10 Tage	Mo 13.10.14	Fr 24.10.14
20	Prüfung: Statik / Brandschutznachweis	10 Tage	Mo 27.10.14	Fr 07.11.14
21	**Außenanlagen Teil 1**	**20 Tage**	**Mo 06.10.14**	**Fr 31.10.14**
22	Allgemeine Geländeherrichtung	20 Tage	Mo 06.10.14	Fr 31.10.14
23	Rückbau des vorh. Bolzplatzes	20 Tage	Mo 06.10.14	Fr 31.10.14
24	**Vorfertigung / Gründung / Erschließung**	**30 Tage**	**Mo 10.11.14**	**Fr 19.12.14**
25	Vorfertigung	30 Tage	Mo 10.11.14	Fr 19.12.14
26	Gründungs- / Erschließungsarbeiten	10 Tage	Mo 08.12.14	Fr 19.12.14
27	**Modulmontage**	**58 Tage**	**Mo 22.12.14**	**Mi 11.03.15**
28	Lieferung und Modulmontage	5 Tage	Mo 22.12.14	Fr 26.12.14
29	Außenarbeiten (Dach / Fassade)	35 Tage	Mo 29.12.14	Fr 13.02.15
30	Innenausbau	50 Tage	Mo 29.12.14	Fr 06.03.15
31	Abnahme	2 Tage	Mo 09.03.15	Di 10.03.15
32	frühstmögliche Nutzung	0 Tage	Mi 11.03.15	Mi 11.03.15
33	**Außenanlagen Teil 2**	**20 Tage**	**Mo 30.03.15**	**Fr 24.04.15**
34	Terrassen, Wege, Bepflanzung	20 Tage	Mo 30.03.15	Fr 24.04.15
