Projektablaufplan: Kapazitätserweiterung Kita Traumland

Stand: 17.06.2014

Anlage 6 zur BV0086/2014
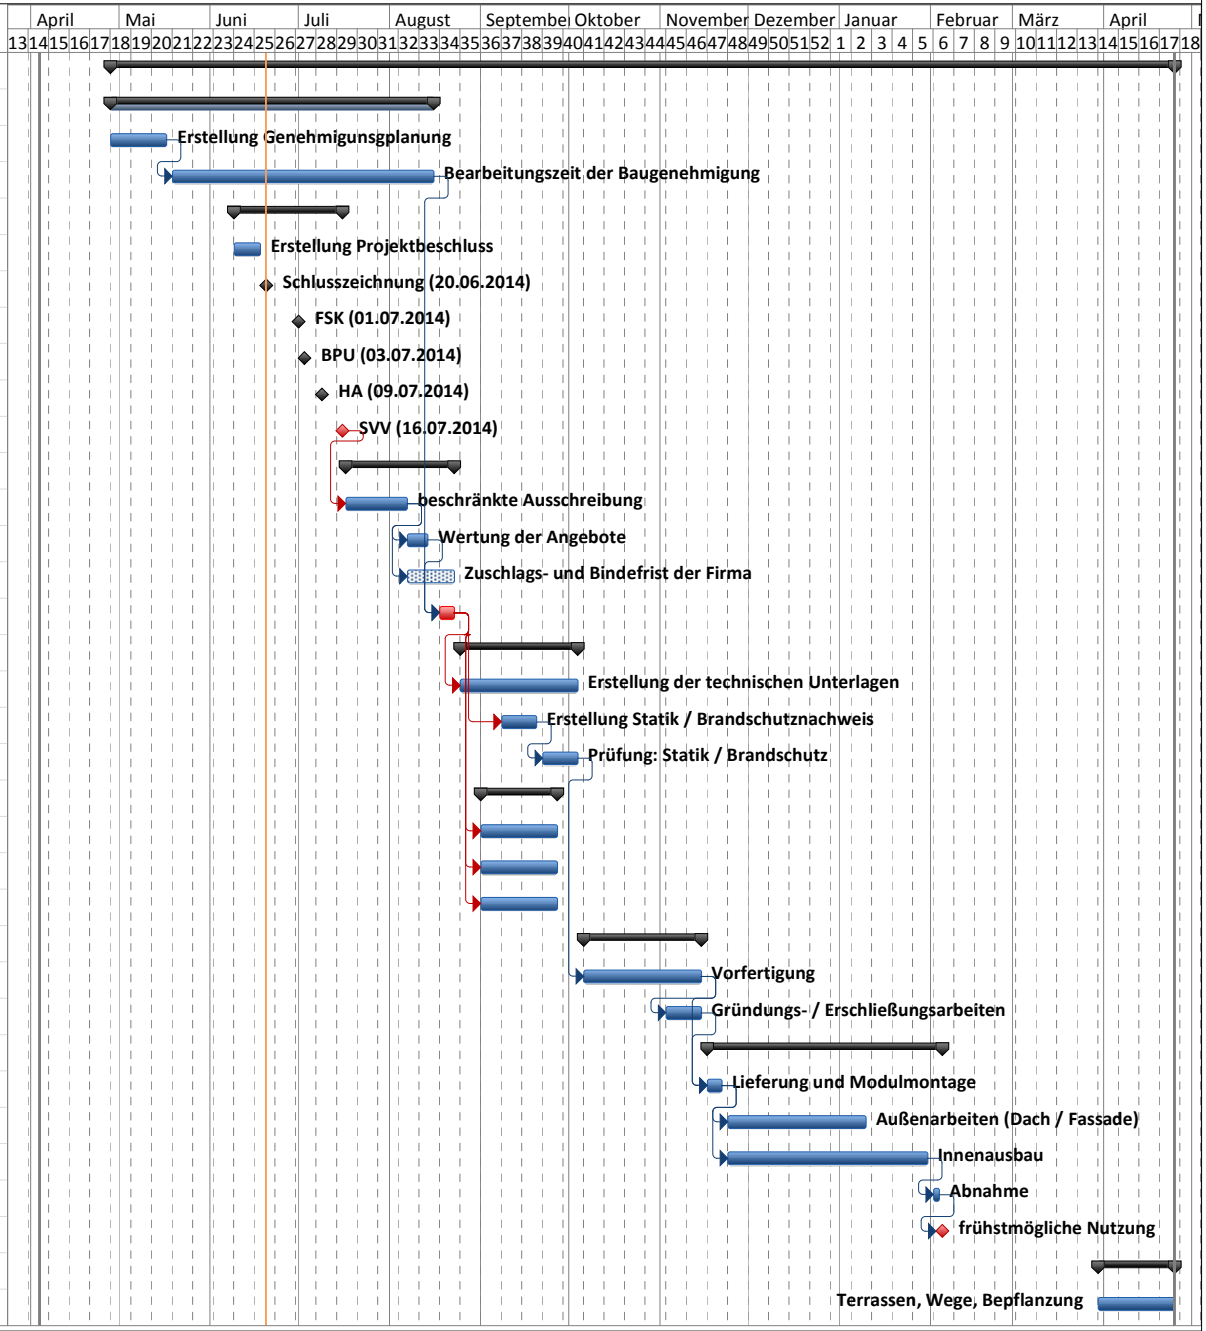
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Erweiterung Kita TL**	**260 Tage**	**Mo 28.04.14**	**Fr 24.04.15**
2	**Genehmigungsplanung**	**80 Tage**	**Mo 28.04.14**	**Fr 15.08.14**
3	Erstellung Genehmigungsgplanung	15 Tage	Mo 28.04.14	Fr 16.05.14
4	Bearbeitungszeit der Baugenehmigung	65 Tage	Mo 19.05.14	Fr 15.08.14
5	**Projektbeschluss**	**27 Tage**	**Mo 09.06.14**	**Mi 16.07.14**
6	Erstellung Projektbeschluss	7 Tage	Mo 09.06.14	Di 17.06.14
7	Schlusszeichnung (20.06.2014)	0 Tage	Fr 20.06.14	Fr 20.06.14
8	FSK (01.07.2014)	0 Tage	Di 01.07.14	Di 01.07.14
9	BPU (03.07.2014)	0 Tage	Do 03.07.14	Do 03.07.14
10	HA (09.07.2014)	0 Tage	Mi 09.07.14	Mi 09.07.14
11	SVV (16.07.2014)	0 Tage	Mi 16.07.14	Mi 16.07.14
12	**Ausschreibung / Vergabe**	**27 Tage**	**Do 17.07.14**	**Fr 22.08.14**
13	beschränkte Ausschreibung	15 Tage	Do 17.07.14	Mi 06.08.14
14	Wertung der Angebote	5 Tage	Do 07.08.14	Mi 13.08.14
15	Zuschlags- und Bindefrist der Firma	12 Tage	Do 07.08.14	Fr 22.08.14
16	Auftragsvergabe	5 Tage	Mo 18.08.14	Fr 22.08.14
17	**Technische Bearbeitung**	**30 Tage**	**Mo 25.08.14**	**Fr 03.10.14**
18	Erstellung der technischen Unterlagen	30 Tage	Mo 25.08.14	Fr 03.10.14
19	Erstellung Statik / Brandschutznachweis	10 Tage	Mo 08.09.14	Fr 19.09.14
20	Prüfung: Statik / Brandschutz	10 Tage	Mo 22.09.14	Fr 03.10.14
21	**Außenanlagen Teil 1**	**20 Tage**	**Mo 01.09.14**	**Fr 26.09.14**
22	Allgemeine Geländeherrichtung	20 Tage	Mo 01.09.14	Fr 26.09.14
23	Umbau Regenwasserversickerungsanlage	20 Tage	Mo 01.09.14	Fr 26.09.14
24	Errichtung der Stellplatzanlage	20 Tage	Mo 01.09.14	Fr 26.09.14
25	**Vorfertigung / Gründung / Erschließung**	**30 Tage**	**Mo 06.10.14**	**Fr 14.11.14**
26	Vorfertigung	30 Tage	Mo 06.10.14	Fr 14.11.14
27	Gründungs- / Erschließungsarbeiten	10 Tage	Mo 03.11.14	Fr 14.11.14
28	**Modulmontage**	**58 Tage**	**Mo 17.11.14**	**Mi 04.02.15**
29	Lieferung und Modulmontage	5 Tage	Mo 17.11.14	Fr 21.11.14
30	Außenarbeiten (Dach / Fassade)	35 Tage	Mo 24.11.14	Fr 09.01.15
31	Innenausbau	50 Tage	Mo 24.11.14	Fr 30.01.15
32	Abnahme	2 Tage	Mo 02.02.15	Di 03.02.15
33	frühstmögliche Nutzung	0 Tage	Mi 04.02.15	Mi 04.02.15
34	**Außenanlagen Teil 2**	**20 Tage**	**Mo 30.03.15**	**Fr 24.04.15**
35	Terrassen, Wege, Bepflanzung	20 Tage	Mo 30.03.15	Fr 24.04.15
